




**Voortgangsrapportage
Tranche 1 Uitvoeringsprogramma
DB 13 november 2023**

Eerste tranche uitvoeringsprogramma

(besluit AB 19-12-22)

Voor gehele gebied:

1,2,5,6,7

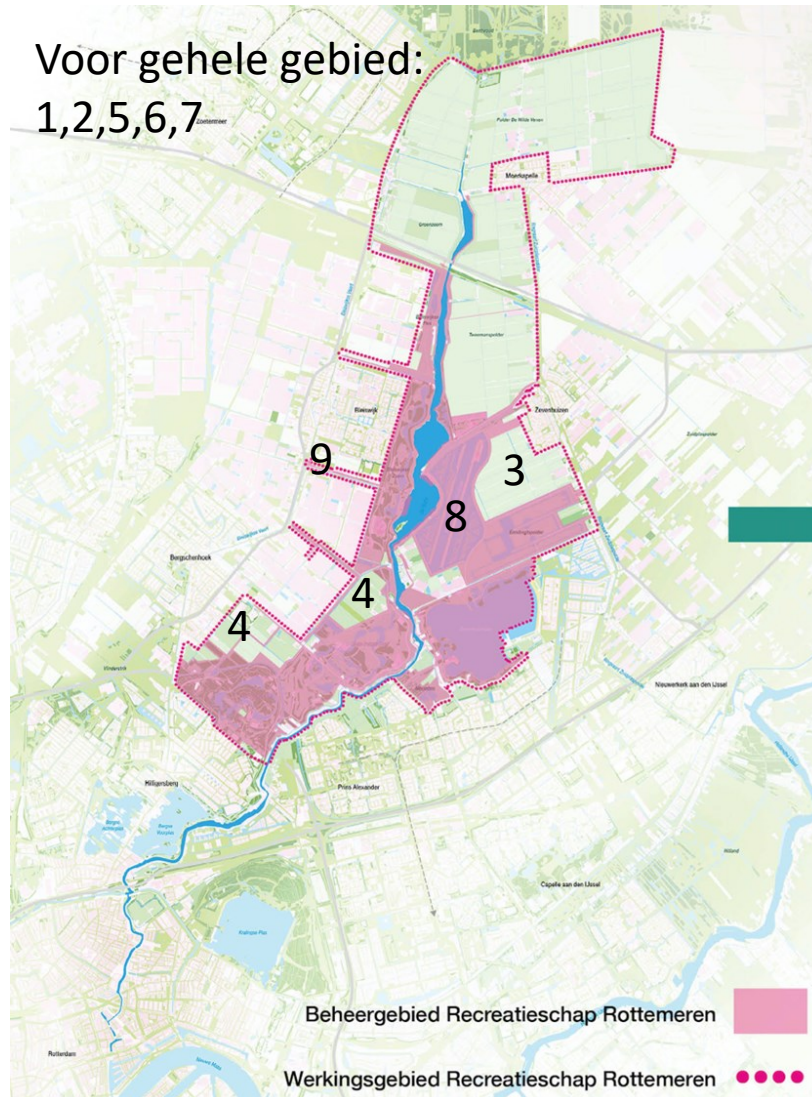

1. Project verbetering Verbindingen op en langs de Rotte-oever (1)
2. Uitwerking groen-blauwe ribben (3)
3. Verkenning Eendragtspolder (5)
4. Verkenning Hoekse Park West en Oost(6)
5. Maatregelenpakket voor versterken van biodiversiteit (9)
6. Handboek meubilair en infrastructuur (10)
7. Inventarisatie en realisatie onderhoud door lokale partijen (39)
8. Trainingsroute wielrenners WAB (45)
9. Ontwikkelingen Merenweg (28)

Bovenstaande nummers corresponderen met nummers op de kaart.

Financieel overzicht

	Budget	Besteed (dd 20-10-23)	Nog beschikbaar
Projectmanagement(*)	80.000	27.520	52.480
Trainingsroute WAB	32.500	9.827	22.673
Handboek Meubilair en infrastructuur	34.000	1.145	32.855

* De voorbereiding van de projecten is door de programmamanager op projectmanagement geschreven

1) Project verbetering Verbindingen op en langs de Rotte Oevers



- De Rotte is drager van het landschapspark, wens tot sterke verbindingen met omgeving.
- Principes uit Ontwikkelplan voor de Rotte oevers verdiepen en uitwerken.
- Eerste verkennend gesprek met landschapsarchitecten gemeenten gehad.
- Kennis gemaakt met het net benoemde kernteam bij gemeente Rotterdam voor Rotterdamse deel van de Rotte en besproken dat dit project in samenspraak met Rotterdamse deel van de Rotte opgezet moet worden.

Projectbeheersing	Status	Toelichting
Financiën	+	€ 63.100 beschikbaar. Nog geen kosten gemaakt
Organisatie	0	Samen met Rotterdam, zodat Rotterdamse deel ook betrokken wordt.
Planning	0	Nog niet gestart
Informatie en communicatie	0	
Kwaliteit	0	
Risico's	0	

2) Uitwerking groen blauwe ribben

- De ribben zijn de toegang tot het gebied
- Wens om deze herkenbaar te laten zijn en te versterken
- Inventariseren en keuze maken welke “Rib” eerst.
- Lansingerland heeft een inventarisatie van de ribben binnen haar gemeenten gemaakt. In overleg met Zuidplas of daar ook de inventarisatie uitgevoerd kan worden.
- Bij de gemeente Rotterdam is kernteam van start gegaan voor de projecten op Rotterdams grondgebied. Ook in dat programma staan een aantal ribben genoemd.



Projectbeheersing	Status	Toelichting
Financiën	+	€13.500 beschikbaar. Nog geen kosten gemaakt
Organisatie	0	Eerste inventarisatie is door gemeente Lansingerland gemaakt
Planning	0	Vorbereidingsfase
Informatie en communicatie	0	
Kwaliteit	0	
Risico's	0	Beperkte financiën beschikbaar dus blijft bij inventarisatie

3) Verkenning Eendragtspolder

- Verkennen of en hoe we samen met eigenaren en gebruikers komen tot doorontwikkeling, met bijvoorbeeld recreatieve dooradering en natuurinclusieve landbouw
- Verkenning naar geschikte bureaus uitgevoerd.
- VAAC heeft projectopdracht vastgesteld.
- Vraag bij Zuidplas neergelegd wie projectleider levert: gemeente of SBB.

Projectbeheersing	Status	Toelichting
Financiën	+	€29.000 beschikbaar. Nog geen kosten gemaakt
Organisatie	+	Samenwerking met Zuidplas
Planning	+	Opstartfase 17-10 projectopdrachtformulier naar VAAC voor vaststelling
Informatie en communicatie	0	2 juni kennismakingsgesprek LTVR en dhr Van der Hoek, 5-9 bij dhr Van der Wel
Kwaliteit	0	
Risico's	0	



4) Verkenning Hoekse Park



- Samen met eigenaren en gebruikers komen tot doorontwikkeling
- Hoekse Park West: uitbreiding Lage Bergse bos met bosrijke invulling en enkele attracties (inpassing Boerderij Lansingerland en opvang vluchtelingen)
- Hoekse park Oost uitbreiding Hoge Bergse Bos (natuur inclusieve landbouw, recreatieve “dooradering”)
- Voorbereidende gesprekken over exacte projectformulering in afrondende fase. Gemeente heeft wens geuit om projectleider te leveren.

Projectbeheersing	Status	Toelichting
Financiën	+	€34.500 beschikbaar. Nog geen kosten gemaakt
Organisatie	+	Samen met Lansingerland, Lansingerland levert projectleider
Planning	0	Vorbereidingsfase 28-11 projectopdracht naar VAAC
Informatie en communicatie	0	Inpassing “Paard en coaching” in Hoekse Park West, gesprek golfbaan gehad.
Kwaliteit	0	
Risico's	0	

5) Maatregelenpakket voor versterken biodiversiteit en monitoring

- Binnen het Rottemeren gebied zijn een aantal prachtige natuurplekjes aanwezig en zeldzame vogelsoorten aanwezig. Het Recreatieschap doet al veel om de biodiversiteit te versterken, zoals sinusmaaien rietranden, ander maaibeleid graslanden en kleinschalig beheer door Rotta.
- Om adhoc maatregelen te voorkomen is het wenselijk om te starten met monitoring zodat er een continue cyclus ontstaat van verbetering. Project moet monitoringsystematiek opleveren en verbetercyclus opstarten.

Projectbeheersing	Status	Toelichting
Financiën	+	€40.000 beschikbaar. Nog geen kosten gemaakt
Organisatie	0	Projectteam oprichten
Planning	+	Opstartfase Projectopdracht goedgekeurd door VAAC, opdracht bij bureau uitzetten (november 2023).
Informatie en communicatie	0	Afstemming met beheerteam, ecologen gemeenten en Rotta
Kwaliteit	0	
Risico's	0	



6) Handboek Meubilair en infrastructuur

- Leidraad voor vormgeving, herkenbare uitstraling
- Projectopdracht vastgesteld in VAAC (16-5-23)
- Projectleider is benoemd. Zij heeft eerste verkenningen uitgevoerd naar afspraken die elders in het gebied zijn gemaakt over meubilair (oa. Lage Bergse Bos).
- Verdeling in handboek en concrete toolkits voor bijv meubilair, paden, parkeerterreinen etc

Projectbeheersing	Status	Toelichting
Financiën	+	Nog 32.855 beschikbaar.
Organisatie	0	
Planning	0	Opstartfase Projectopdracht vastgesteld door VAAC
Informatie en communicatie	0	
Kwaliteit	0	
Risico's	0	



7) Inventarisatie en realisatie onderhoud lokale partijen

- Al veel via Rotta en Stichting Hennipgaarde en hygiene bestek met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
- Binnenkort uitwisseling met beheerders Park Lingenzegen. Zij hebben beheer uitbesteedt aan 40 lokale partijen.

Projectbeheersing	Status	Toelichting
Financiën	+	€40.000 beschikbaar. Nog geen kosten gemaakt
Organisatie	0	
Planning	0	Vorbereidingsfase
Informatie en communicatie	0	
Kwaliteit	0	
Risico's	0	



8) Trainingsroute Wielrenners WAB

- Trainingsroute rond de WAB voor wielrenners
- Verkeerskundige verkenning in concept klaar
- 31 oktober bespreking met verkeerskundige van gemeenten gepland.

Projectbeheersing	Status	Toelichting
Financiën	+	Nog € 22.673 beschikbaar.
Organisatie	+	
Planning	+	Uitvoeringsfase 31-10: bespreken concept rapport bespreken met verkeerskundigen gemeenten
Informatie en communicatie	0	
Kwaliteit	0	
Risico's	0	



9) Ontwikkeling Merenweg



- 1^e gesprek met gemeente gehad
- Nabij gelegen woningbouwplannen vertraagd
- Bij realisatie woningbouw deel van de Merenweg overdragen aan gemeente
- Intentie om gezamenlijk ontwerp te maken rekening houdend met ondergrond en beschikbare ruimte

Projectbeheersing	Status	Toelichting
Financiën	+	€35.500 beschikbaar. Nog geen kosten gemaakt
Organisatie	0	Lansingerland is trekker
Planning	0	Vorbereidingsfase Woningbouwontwikkeling vertraagd
Informatie en communicatie	0	
Kwaliteit	0	
Risico's	0	Fysieke krapte, kabels en leidingen dus extra bomen lastig
