recreatieschap Rottemeren

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp	:	Oeververstersking fase 2 (urgente stukken naar voren halen)
Kenmerk	:	D25-7868
Bijlagen	:	-
Besluitdatum	:	7 juli 2025
Voorbereid door	:	Cees van Vliet

---

1. BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- **In te stemmen met het uitvoeren van de oeververstersking fase 2 op alleen de meest urgente stukken.**
- **Daarvoor het niet bestede deel (€ 240.000,- van het krediet "herstel Van Oudheusdenweg") over te hevelen naar een nieuw krediet "oeververstersking fase 2-urgent".**

---

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Oeververstersking fase 1 en fase 2
Afgelopen jaar is in nauwe samenwerking met Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard gewerkt aan oeververstersking fase 1. In fase 1 zijn oevers versterkt in het Hoge Bergse bos en rond de Zevenhuizersluis. Medio april dit jaar zijn de laatste werkzaamheden gereed.

Bij eerdere verkenningen is geconcludeerd dat ook een fase 2 nodig is. In deze fase 2 zijn drie locaties opgenomen (zie bijlage 1).

- Locatie 1: nabij de Bonk:
- Locatie 2: aan de Rotte ter hoogte van Hoge Bergse Bos
- Locatie 3: aan de Rotte ten westen van Rottebanbrug

Oeververstersking fase 2: kosten en risico inschatting
Er is een eerste raming gemaakt van de kosten door Walhout Civil Hieruit blijkt dat de kosten voor heel fase 2 hoger zijn dan in eerder stadium geschat waren. Namelijk € 700.000 in plaats van € 450.000. Gezien deze onverwachts hoge kosten heeft het beheerteam een inventarisatie gedaan om te kijken of een verdere fasering mogelijk zou zijn. Daarnaast zijn subsidiemogelijkheden bij HHSK verkend voor het realiseren van natuurvriendelijke oevers.

Uit de risico-inventarisatie is gebleken dat locatie 1 nabij de Bonk het herstel nog uitgesteld kan worden tot 2026/2027. Hier is geen urgente gevaarzetting voor fietsers en automobilisten. Bij locatie 2 is een stuk van circa 400 meter dusdanig slecht dat zo spoedig mogelijk herstel sterk wordt aangeraden. De afstand tussen de Rotte en het fietspad is dusdanig klein dat fietsers eenvoudig in het water kunnen vallen. Dit is ook het geval bij twee

delen van locatie 3 (Zuid 1/3 en zuid 2/3). Dit betreft een stuk van circa 200 meter. Andere delen van locatie 2 en 3 kunnen uitgesteld worden.

Subsidiemogelijkheden
In overleg met HHSK is gekeken of fase 2 in aanmerking komt voor een subsidie voor natuurvriendelijke oevers. Natuurvriendelijke oevers dragen bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit, een belangrijk punt om de eisen vanuit kaderrichtlijn water te halen. HHSK heeft aangegeven dat er op dit moment helaas geen subsidiemogelijkheden zijn. Overigens kijkt HHSK wel naar nieuwe subsidiemogelijkheden, dit is mogelijk het geval vanaf 2028. Daarnaast is geconstateerd dat het huidige ontwerp van de oevers niet voldoet aan de eisen van een natuurvriendelijke oever. Hiervoor is de helling van het talud te steil. In overleg met beheerteam is gebleken dat er mogelijkheden zijn om dit aan te passen. Voor de urgente stukken wordt in overleg met de ontwerper gekeken of aanpassingen mogelijk zijn zonder extra meerkosten en zonder verplichte watercompensatie. Het gaat dan om het naar het water verplaatsen van de nieuwe beschoeiing (creëren van een vooroever) en het realiseren van een flauwere helling.

---

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

DB 26 oktober 2020:	opstellen van een plan van aanpak
AB 30 november 2020:	opstellen van een plan van aanpak
DB 11 oktober 2021:	uitbreiding krediet plan van aanpak
DB 8 november 2021:	instemmen met voorliggend plan
AB 13 december 2021:	besluit tot krediet fase 1 oeververstersking voor een bedrag van € 421.760 voor de locatie Hoge Bergse Bos en Rottekade 1 te Zevenhuizen. In de vergadering is besloten een nader voorstel voor fase 2 af te wachten.

---

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Voor de uitvoering van de oeververstersking zullen vergunningen nodig zijn van HHSK. Deze worden tijdens de voorbereiding aangevraagd.

---

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

Tijdens het AB van 1 juli 2024 is besloten een krediet van € 1.300.000 beschikbaar te stellen voor het volledig herstellen van de asfaltering van de Van Oudheusdenweg. Het project is inmiddels aanbesteed en de aanbesteding is zeer positief verlopen. Er is € 240.000 over gebleven van het krediet. We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar een nieuw krediet voor de “oeververstersking fase 2-urgent”. De verwachting is dat het bedrag voldoende is voor het realiseren van de 3 urgente stukken oeverbescherming.

---

6. COMMUNICATIE

Zodra de werkzaamheden zullen starten zullen omwonenden en recreanten middels borden op de hoogte gebracht worden.

---

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

De agenda is ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer. Voor het project is overleg geweest met HHSK over de subsidiemogelijkheden. De agendapost is afgestemd in de Vaste Ambtelijke adviescommissie.

---

8. VERDERE PROCEDURE

Na instemming van het DB voor de overheveling van het restant krediet van de asfaltering van de Van Oudheusdenweg, is gestart met de voorbereidingen voor het uitvoeren van de oeververstersterking op alleen de meest urgente stukken. De daadwerkelijke uitvoering van de oeververstersterking op alleen de meest urgente stukken zal dan in het najaar 2025 kunnen plaatsvinden.

Voor de overige (nog) niet urgente delen van fase 2 zal volgend jaar een bestuursvoorstel gemaakt worden. Zolang de veiligheidssituatie niet in het geding komt zal gewacht worden tot er eventueel aanspraak gemaakt kan worden op de nieuwe subsidiemogelijkheden bij HHSK. Daarnaast is dit project ook onder de aandacht gebracht bij de nieuw aan te stellen subsidie coördinator.

Hoogachtend,

R. van Raay, bestuurssecretaris

Bijlage 1 Tekeningen van de locaties fase 2

Locatie 1: Bij de Bonk

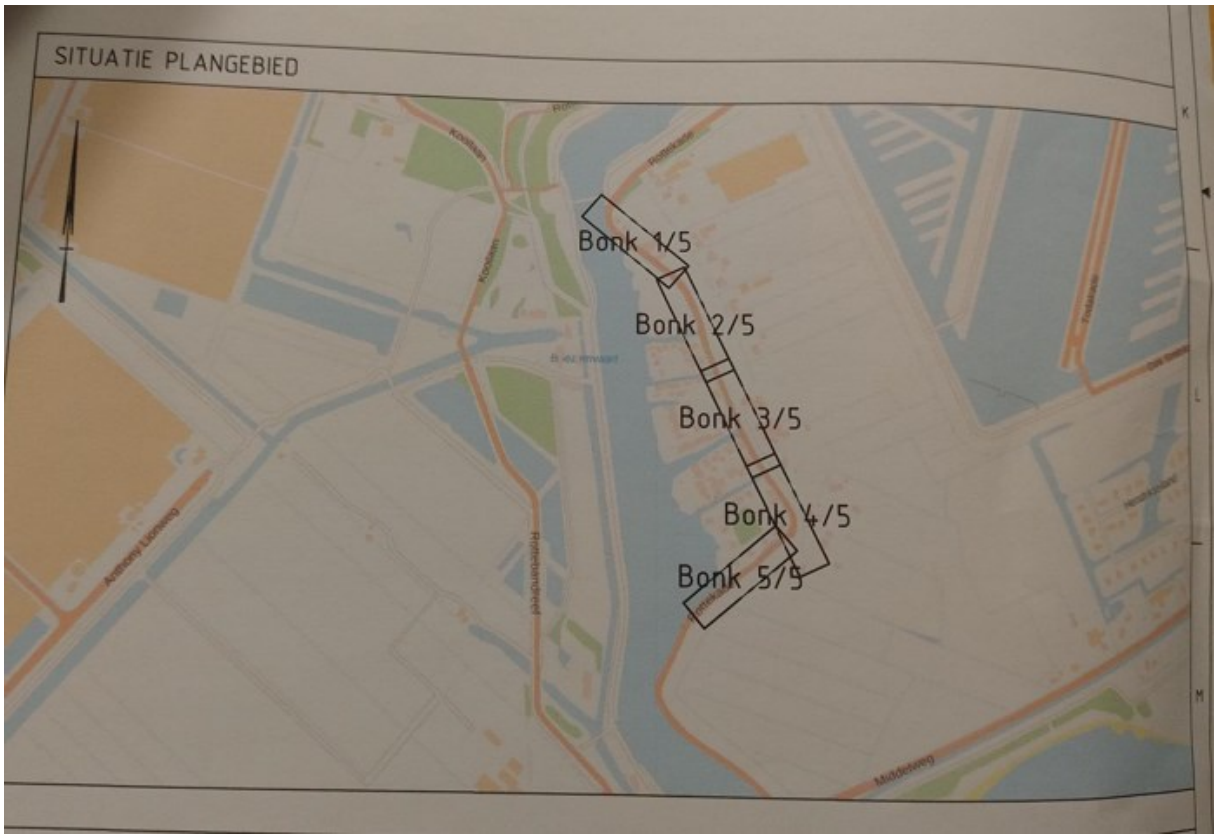

Locatie 2: westzijde Rotte nabij hoge bergse bos

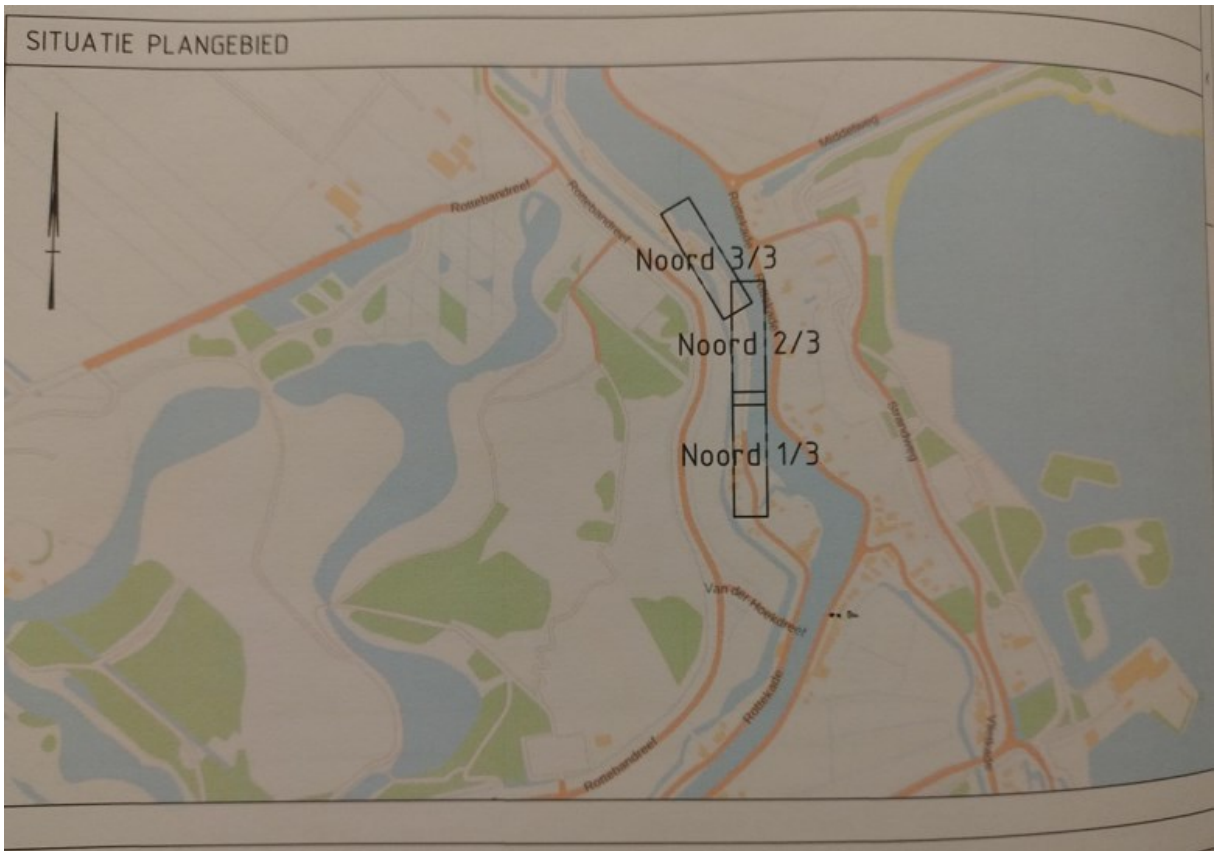
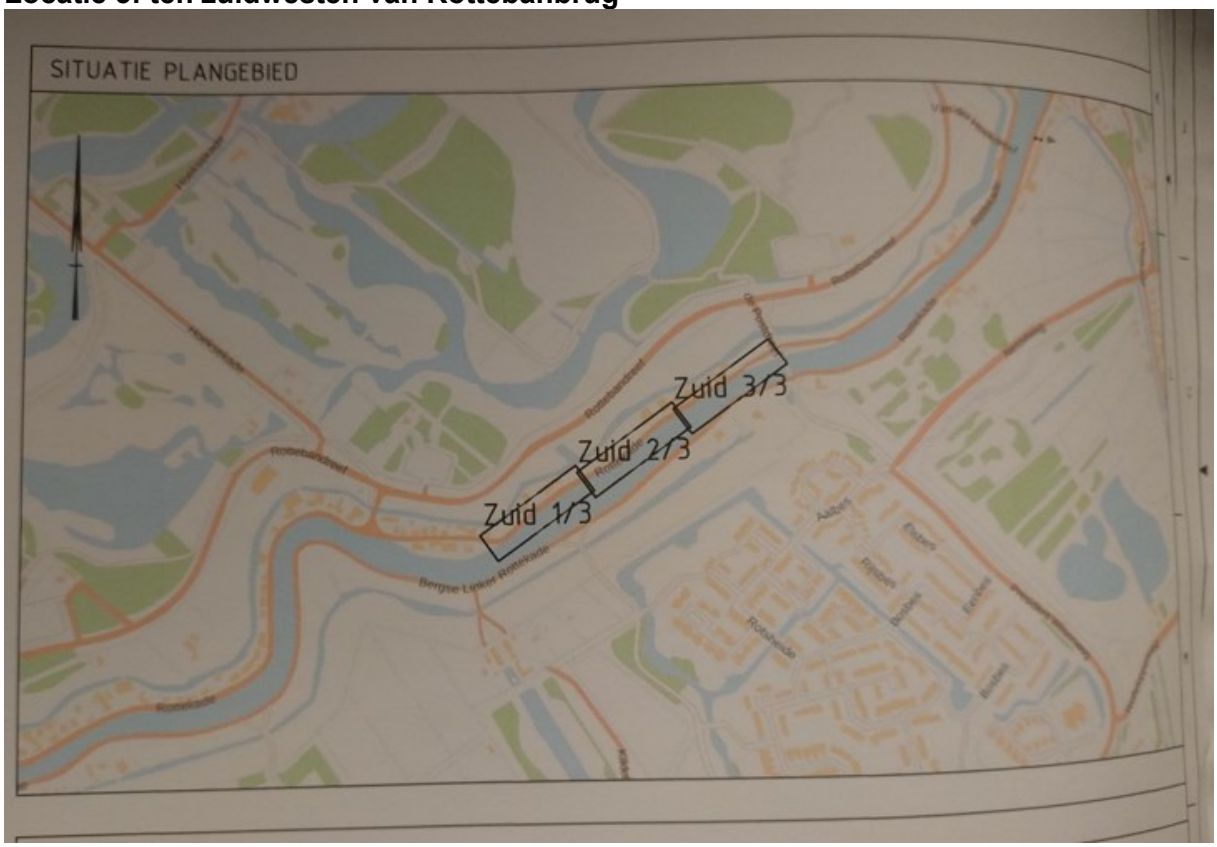
Locatie 3: ten zuidwesten van Rottebanbrug
